

工事請負変更契約 報告書 (都市建設部 土木建設課)

経済建設委員会資料
令和5年7月3日提出

事業名	工 事 名	請負業者名	変更契約金額	変更増額	原契約金額	落札率	変更契約工期	原契約工期
下水道	浦田第一雨水幹線整備 工事	茜建設株式会 社	95,001,500	4,094,200	90,907,300	91.06%	着 手 令和 4年10月4日	着 手 令和 4年10月4日
			—	—	うち消費税		しゅん功 令和 5年 5月31日	しゅん功 令和 5年 3月31日
			8,636,500	372,200	8,264,300			

※主な変更理由

工事実施にあたり、歩行者の安全確保による迂回路設置について、学校関係者及び地元関係者との協議並びに当迂回路製作・設置に不測の日数を要し
工期内でのしゅん功が困難となったため工期を令和5年5月31日に延伸。また、水路構造物設置の際、一部沈下の傾向がみられたため当初の碎石基礎をコン
クリート基礎に変更。その他精査による各工種の数量変更によるもの。

至 直方

浦田第一雨水幹線整備工事

市民公園
運動広場
位置図

新体育館

200号バイパス

施工箇所

浦田駅

至 新飯塚駅

至 鯉田駅

JR筑豊本線

(工事中)



工事請負変更契約 報告書（都市建設部 土木建設課）

経済建設委員会資料
令和5年7月3日提出


事業名	工 事 名	請負業者名	変更契約金額	変更増額	原契約金額	落札率	変更契約工期	原契約工期
下水道	水江雨水ポンプ場新設 (建築)工事	株式会社西組	89,991,000	3,223,000	86,768,000	97.99%	着 手 令和 4年9月6日	着 手 令和 4年9月6日
			—	—	うち消費税		しゅん功 令和 5年 8月10日	しゅん功 令和 5年 3月20日
			8,181,000	293,000	7,888,000			

※主な変更理由

工事着手にあたり、先行工事であった土木工事が湧水による工法変更が生じ本工事への引き渡し期間が遅れたこと。また、当ポンプ場の構造が土木工事にて施工したポンプ槽等が操作室である建屋の基礎となる一体構造物であるため、土木完成物と今後の建屋建築の着手にあたり建築確認審査機関による一体構造物としての確認協議等に不測の期間を要したことにより、工期内でのしゅん功が困難となったため工期を令和5年8月10日に延伸。また、工期延伸に伴う諸経費の増による請負金額の増額変更。

水江雨水ポンプ場新設（建築）工事

位置図

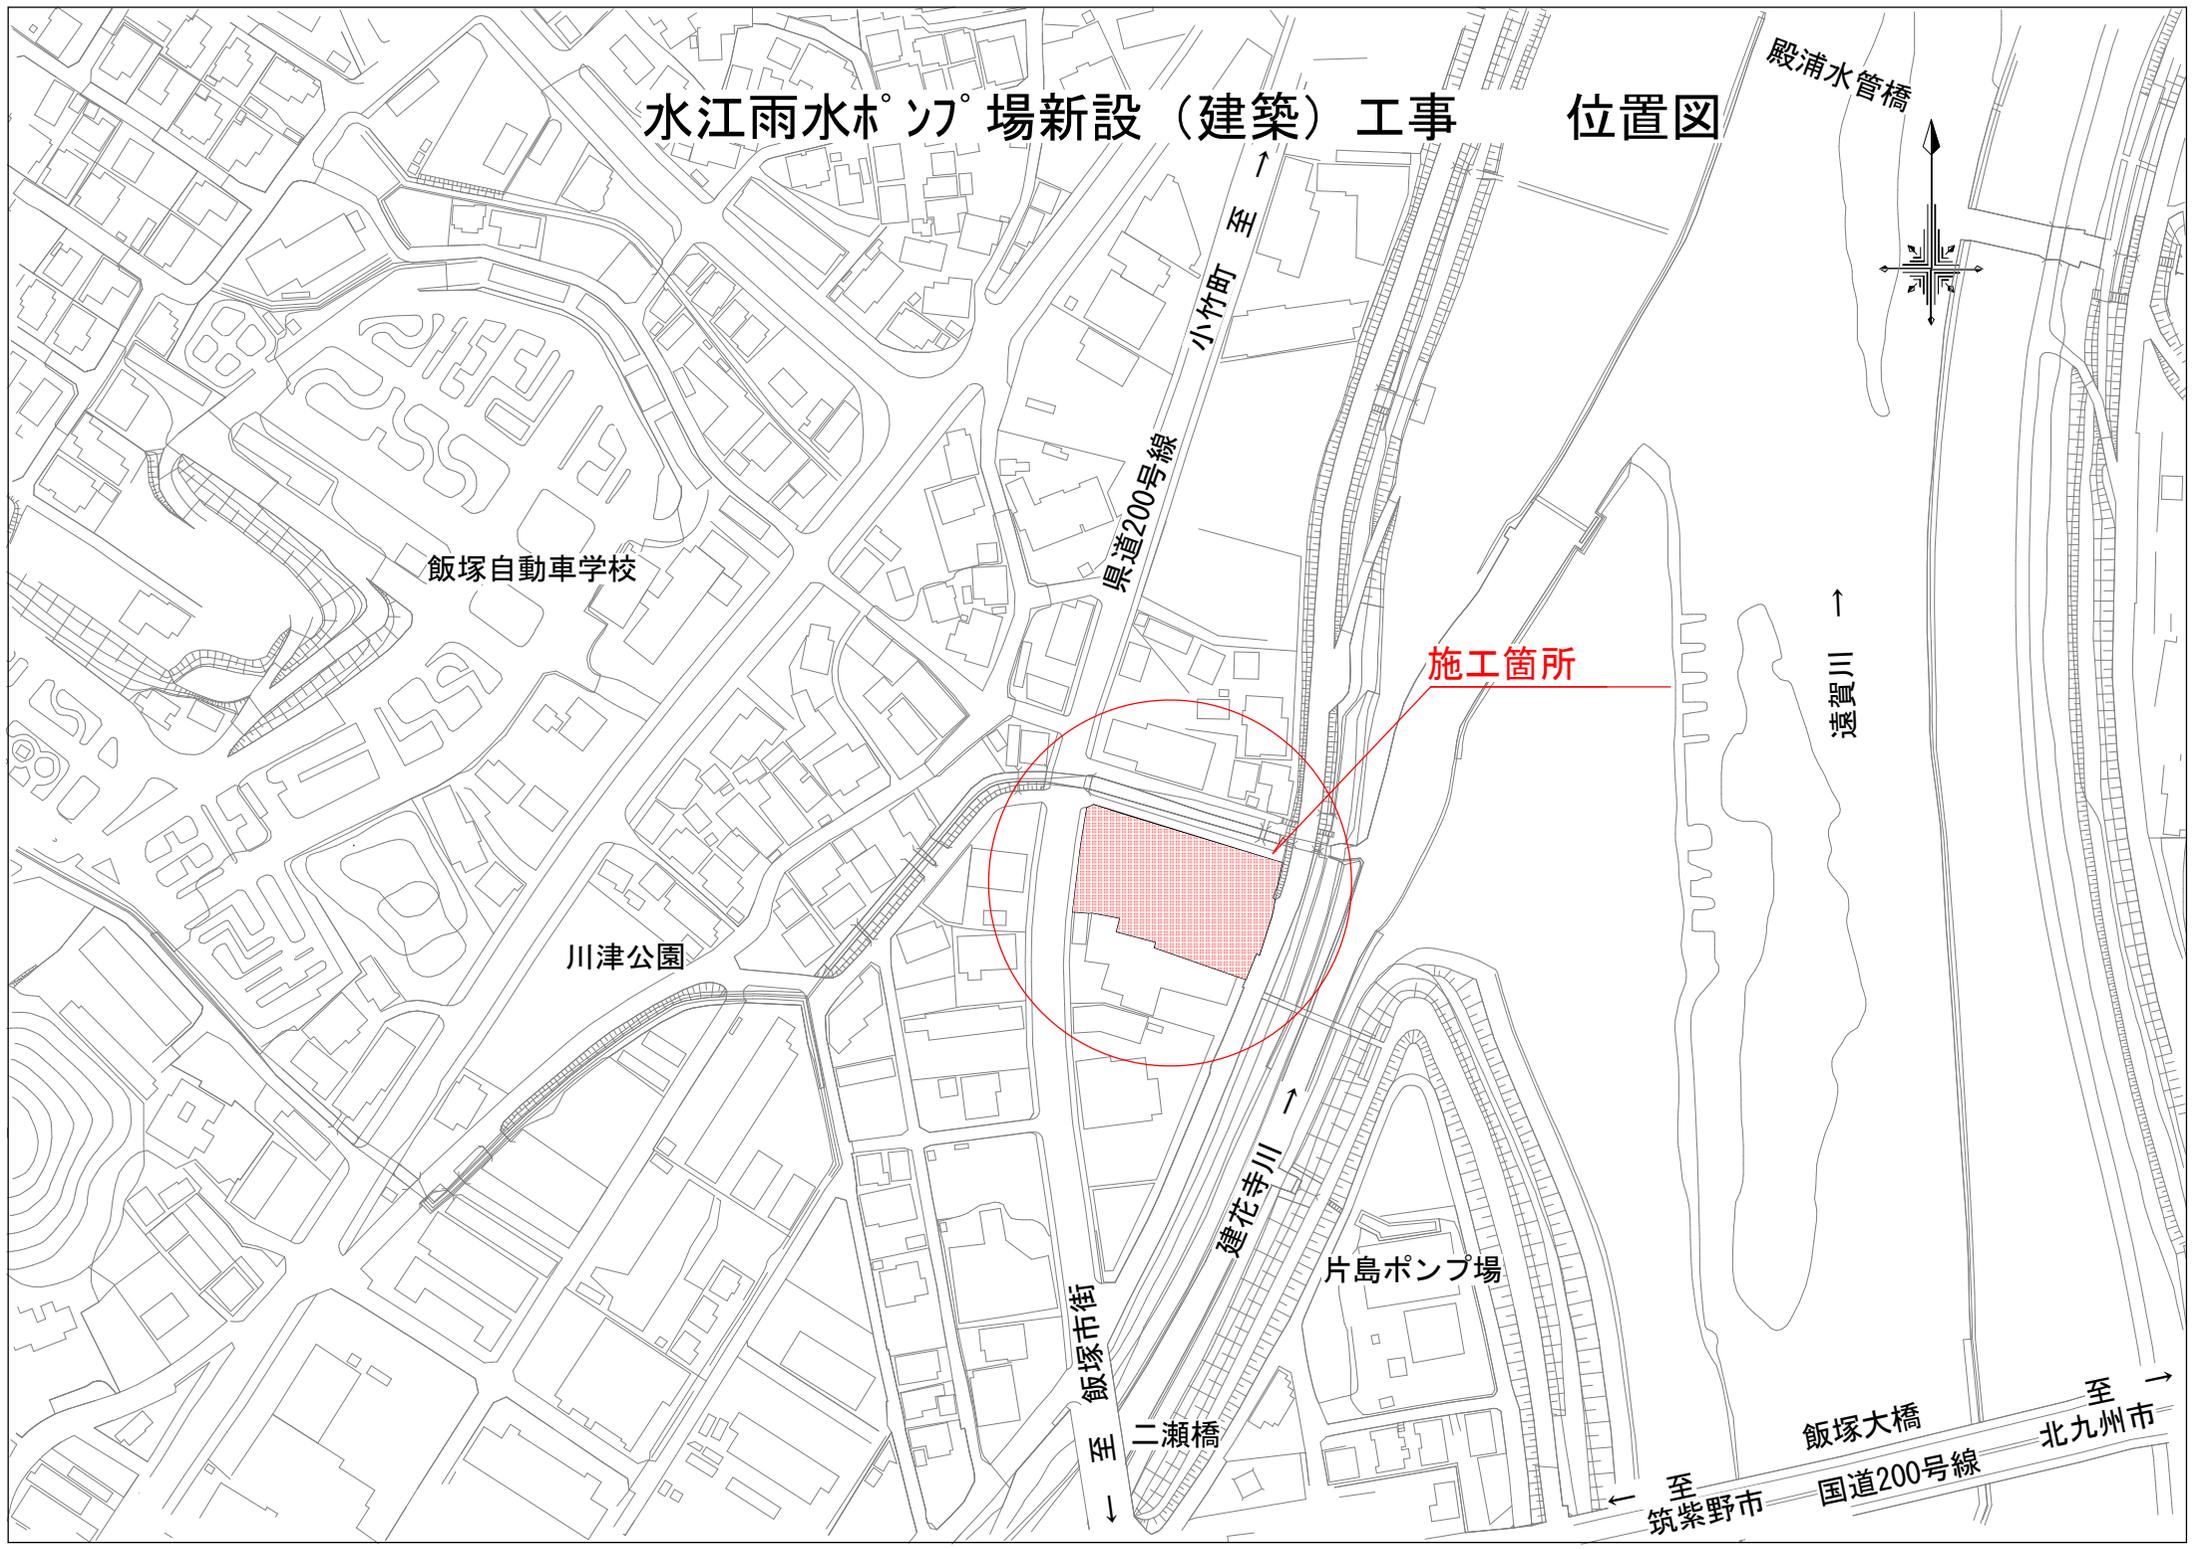

飯塚自動車学校

川津公園

飯塚市街

二瀬橋

建花寺川

片島ポンプ場

施工箇所

国道200号線

小竹町 至

飯塚大橋

国道200号線

至 北九州市

至 筑紫野市

遠賀川

殿浦水管橋
