

## 工事請負変更契約報告書（都市建設部 都市計画課）


経済建設委員会資料  
令和5年8月7日提出

| 事業名          | 工事名           | 請負業者名    | 変更契約金額      | 変更増減額      | 原契約金額       | 落札率    | 変更契約工期         | 原契約工期          |
|--------------|---------------|----------|-------------|------------|-------------|--------|----------------|----------------|
| 菰田・堀池地区活性化事業 | 卸売市場2号線道路改良工事 | 有限会社松本建興 | 90,358,400円 | 2,156,000円 | 88,202,400円 | 90.74% | 着手 令和4年9月21日   | 着手 令和4年9月21日   |
|              |               |          | うち消費税       | うち消費税      | うち消費税       |        | しゅん功 令和5年7月12日 | しゅん功 令和5年7月12日 |
|              |               |          | 8,214,400円  | 196,000円   | 8,018,400円  |        |                |                |

### ※主な変更理由

近接工事の遅れにより調整に不測の期間を要したことにより、工期内でのしゅん功が困難となったため、工期短縮のため、点字ブロックをブロックから溶融式及び貼付式に変更したものを。

# 位置図

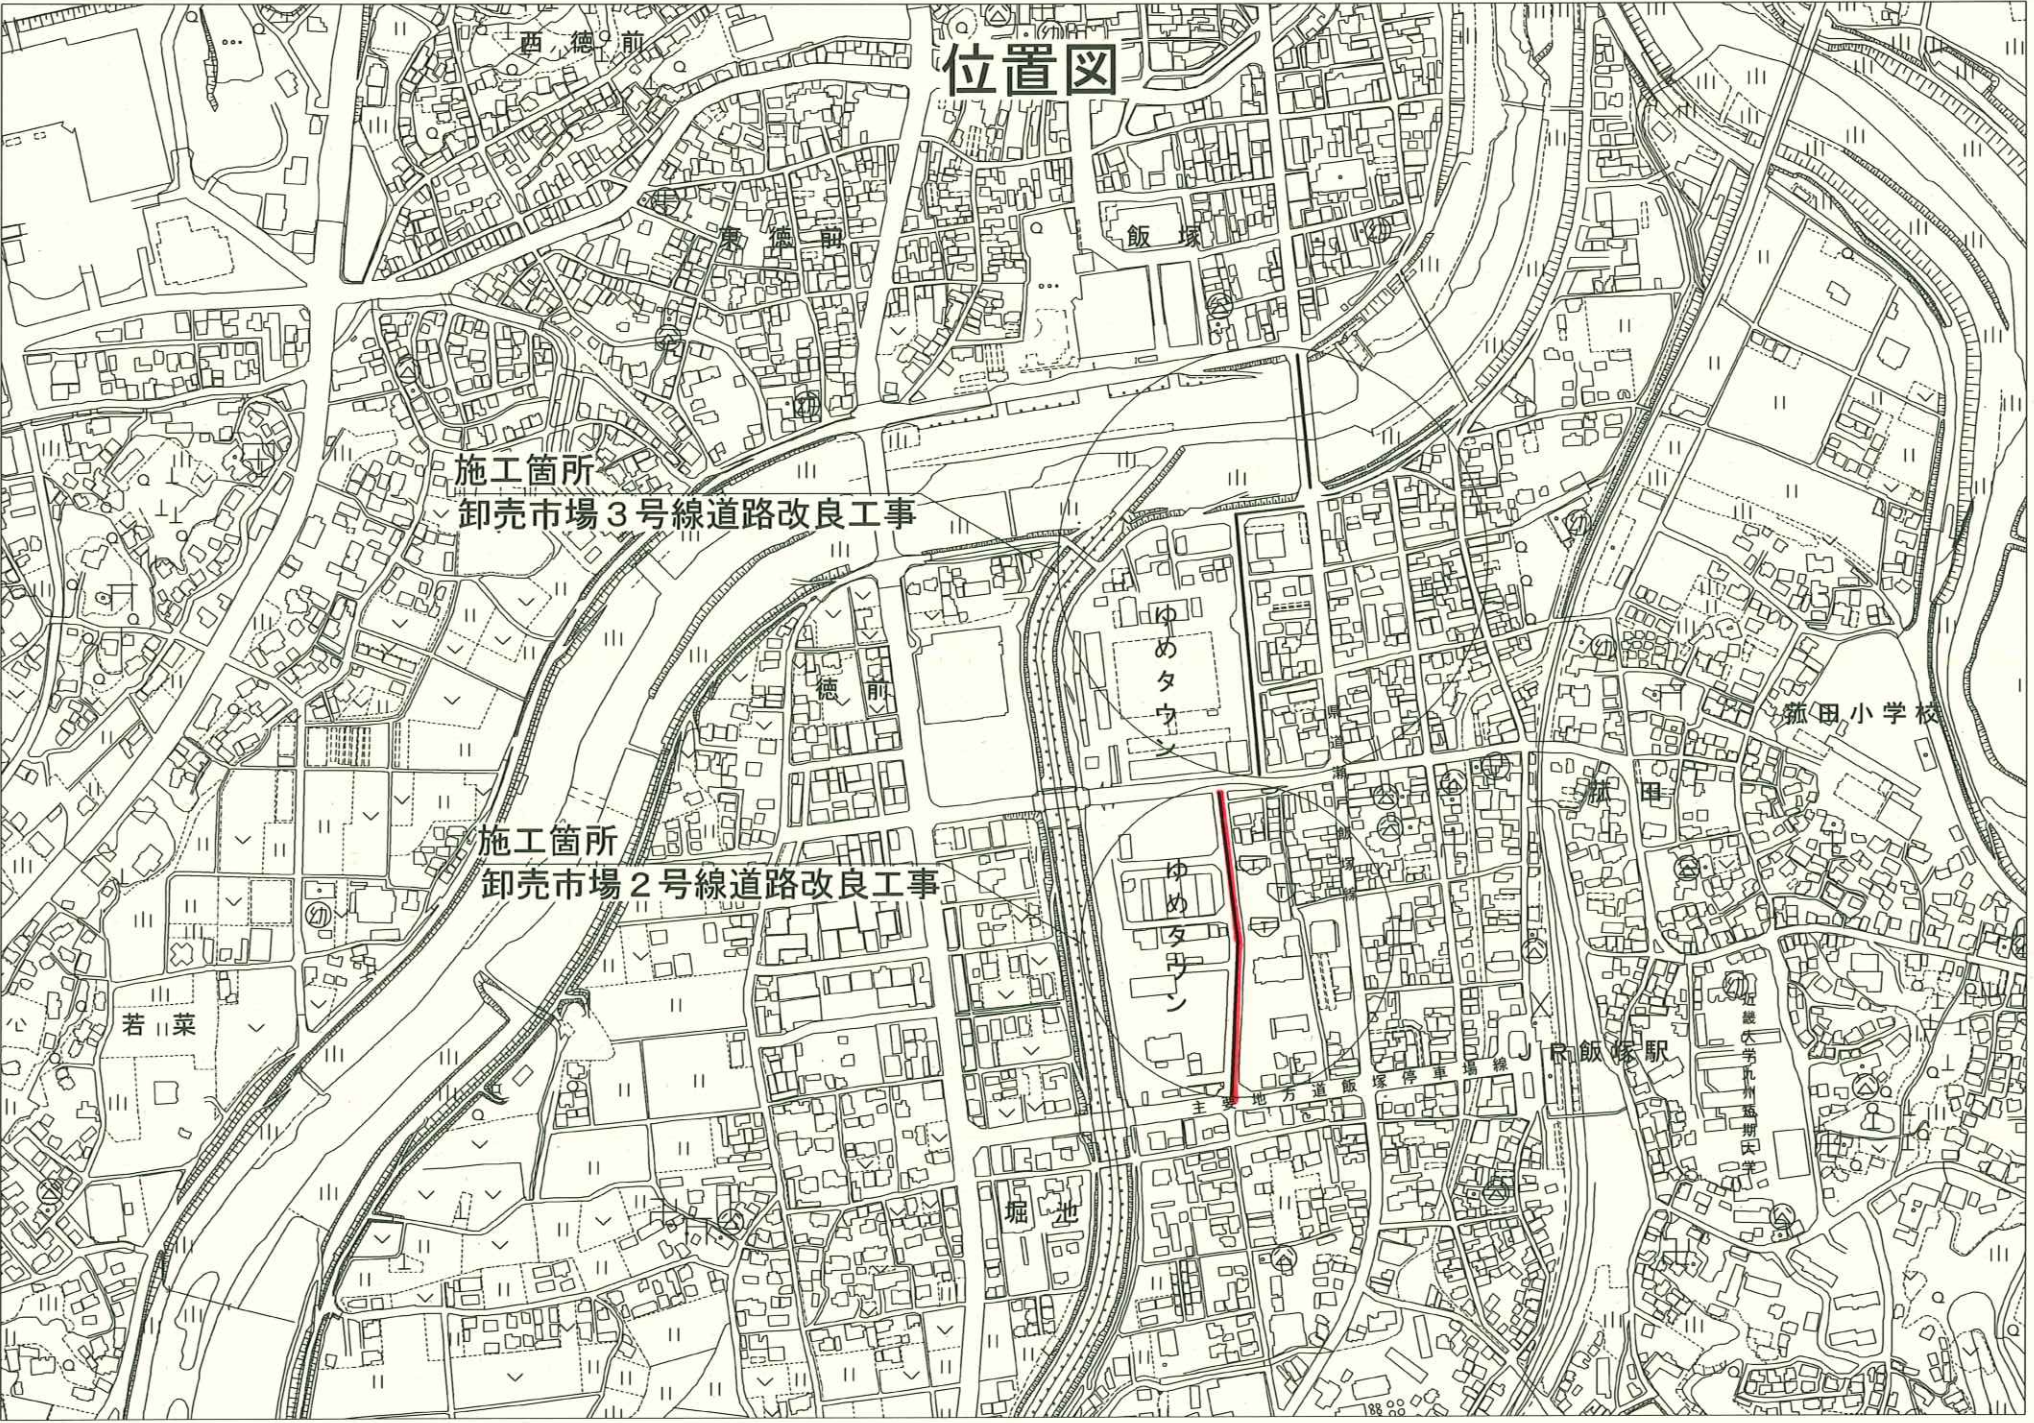

施工箇所  
卸売市場3号線道路改良工事

施工箇所  
卸売市場2号線道路改良工事

飯塚小学校

飯塚駅

ゆめタウン

ゆめタウン

西徳前

東徳前

飯塚

徳前

若菜

池

## 工事請負変更契約報告書 (都市建設部 都市計画課)

経済建設委員会資料  
令和5年8月7日提出

| 事業名          | 工事名           | 請負業者名    | 変更契約金額<br>(2回目) | 変更増減額<br>(2回目) | 変更契約金額<br>(1回目) | 変更増減額<br>(1回目) | 原契約金額       | 落札率    | 変更契約工期<br>(2回目)   | 変更契約工期<br>(1回目) | 原契約工期             |
|--------------|---------------|----------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-------------|--------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 菰田・堀池地区活性化事業 | 卸売市場3号線道路改良工事 | 株式会社小山産業 | 76,308,100円     | 6,969,600円     | 69,338,500円     | 4,052,400円     | 65,286,100円 | 86.00% | 着手<br>令和4年9月21日   | 変更なし            | 着手<br>令和4年9月21日   |
|              |               |          | うち消費税           | うち消費税          | うち消費税           | うち消費税          | うち消費税       |        |                   |                 |                   |
|              |               |          | 6,937,100円      | 633,600円       | 6,303,500円      | 368,400円       | 5,935,100円  |        |                   |                 |                   |
|              |               |          |                 |                |                 |                |             |        | しゅん功<br>令和5年7月28日 |                 | しゅん功<br>令和5年6月12日 |

### ※主な変更理由

管渠型側溝据付において、官民境界での高低差の解消及び影響範囲復元のため、隣接者協議の整った箇所より舗装及び張りコンクリートの増工を2回に分けて変更。

また、近接工事の遅れにより調整に不測の期間を要したことにより、工期内でのしゅん功が困難となったため、2回目の変更において工期短縮のため、点字ブロックをブロックから溶融式及び貼付式に変更し、合わせて工期も令和5年7月28日に延伸したものの。

# 位置図

施工箇所  
卸売市場3号線道路改良工事

施工箇所  
卸売市場2号線道路改良工事

