

工事請負変更契約 報告書（企業局 上水道課）

経済建設委員会資料
令和8年5月19日提出


事業名	工 事 名	受注者名	変更契約金額	変更増減額	原契約金額	落札率	変更契約工期	原契約工期
水道	上三緒地区配水管布設 替工事	株式会社 三英工業	66,520,300円	7,932,100円	58,588,200円	90.59%	—	令和 7年 6月19日 から
			うち消費税 6,047,300円	うち消費税 721,100円	うち消費税 5,326,200円		—	令和 8年3月27日 まで

※主な変更理由

掘削の結果、上層路盤下に鉋滓が敷設されていたことから、その範囲及び厚さを調査した結果、県道施工区間において平均厚さ40cmであることが確認されたため、ボーリング調査工及び舗装版切断工を増工したことによる変更。また、その他精査による数量変更によるもの。

上三緒地区配水管布設替工事 位置図

経済建設委員会資料
令和 8年 5月19日提出

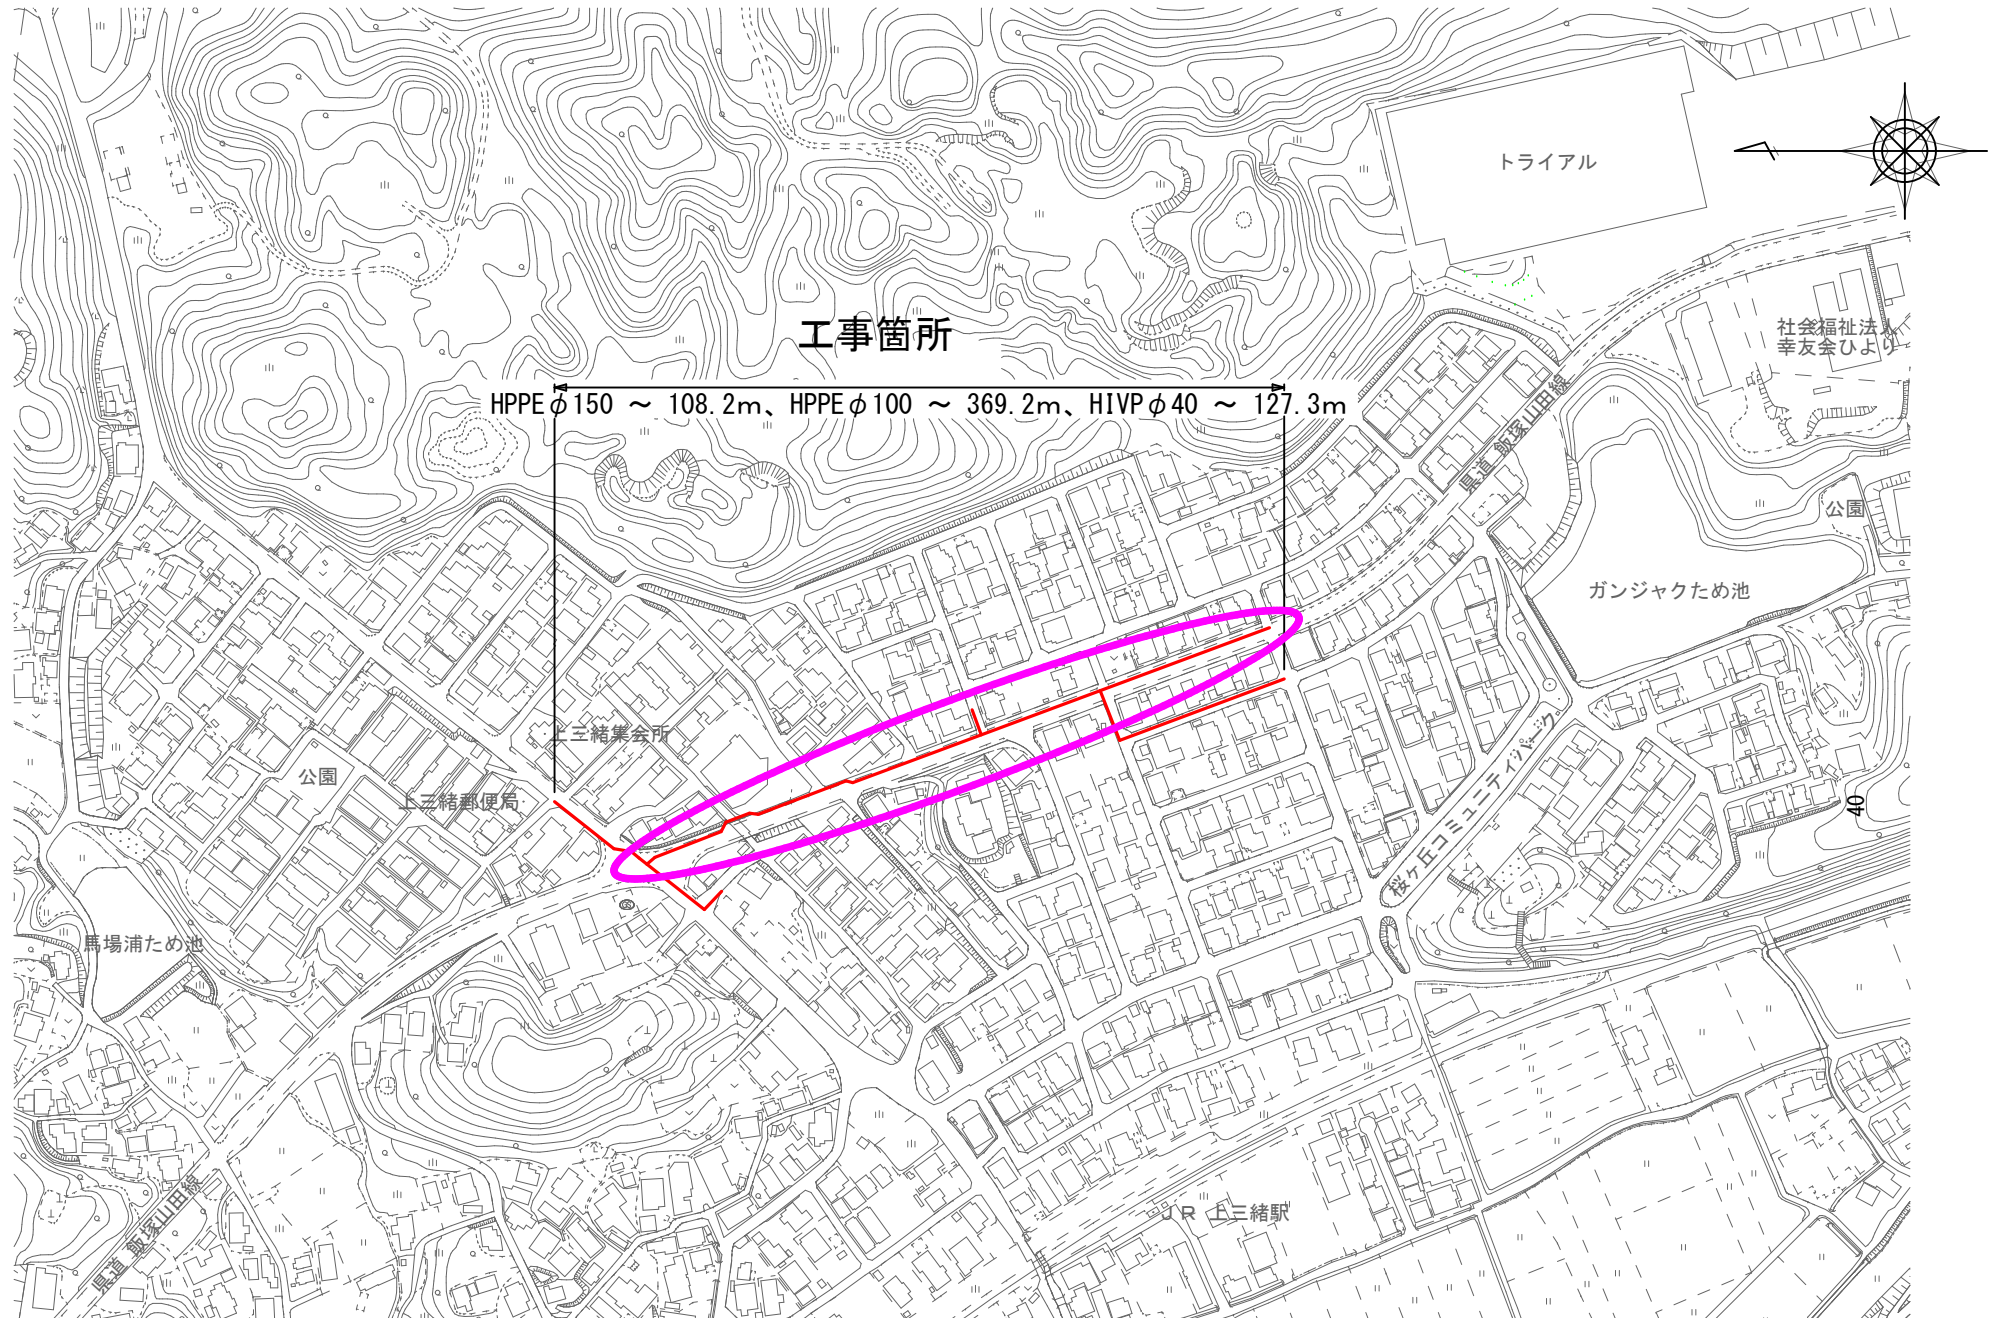

工事請負変更契約 報告書（企業局 上水道課）

経済建設委員会資料
令和8年5月19日提出

事業名	工 事 名	受注者名	変更契約金額	変更増減額	原契約金額	落札率	変更契約工期	原契約工期
水道	津原導水管布設替 (3工区)工事	有限会社 千歳工業	－ うち消費税 －	－ うち消費税 －	79,031,700円 うち消費税 7,184,700円	90.85%	令和 7年 6月12日 から 令和 8年 6月30日 まで	令和 7年 6月12日 から 令和 8年 3月31日 まで

※主な変更理由

現地試掘の結果、水位が高く軟弱地盤であったことから、オープンカット工法を土留工へ変更する必要が生じたことにより、工法検討、材料手配及び施工に期間を要するため、工期の変更を行うもの。

工事請負変更契約 報告書（企業局 上水道課）

経済建設委員会資料
令和8年5月19日提出


事業名	工 事 名	受注者名	変更契約金額	変更増減額	原契約金額	落札率	変更契約工期	原契約工期
水道	津原導水管布設替 (1工区)工事	瓜生・大貴 特定建設工事 共同企業体	278,339,600円	15,943,620円	262,395,980円	98.00%	—	令和 6年 7月19日 から
			うち消費税 25,303,600円	うち消費税 1,449,420円	うち消費税 23,854,180円		—	令和 8年 3月31日 まで

※主な変更理由

掘削の結果、水位が高く、軟弱地盤であったことから、土留工等の工法を変更したことによる増。また、土留工等の工法検討に期間を要したため、工期内の不断水材料等の設置ができなかったことにより設置費用等の減額を行うもの。その他精査による数量変更によるもの。

津原導水管布設替(1工区)工事 位置図

経済建設委員会資料
令和 8年 5月19日提出

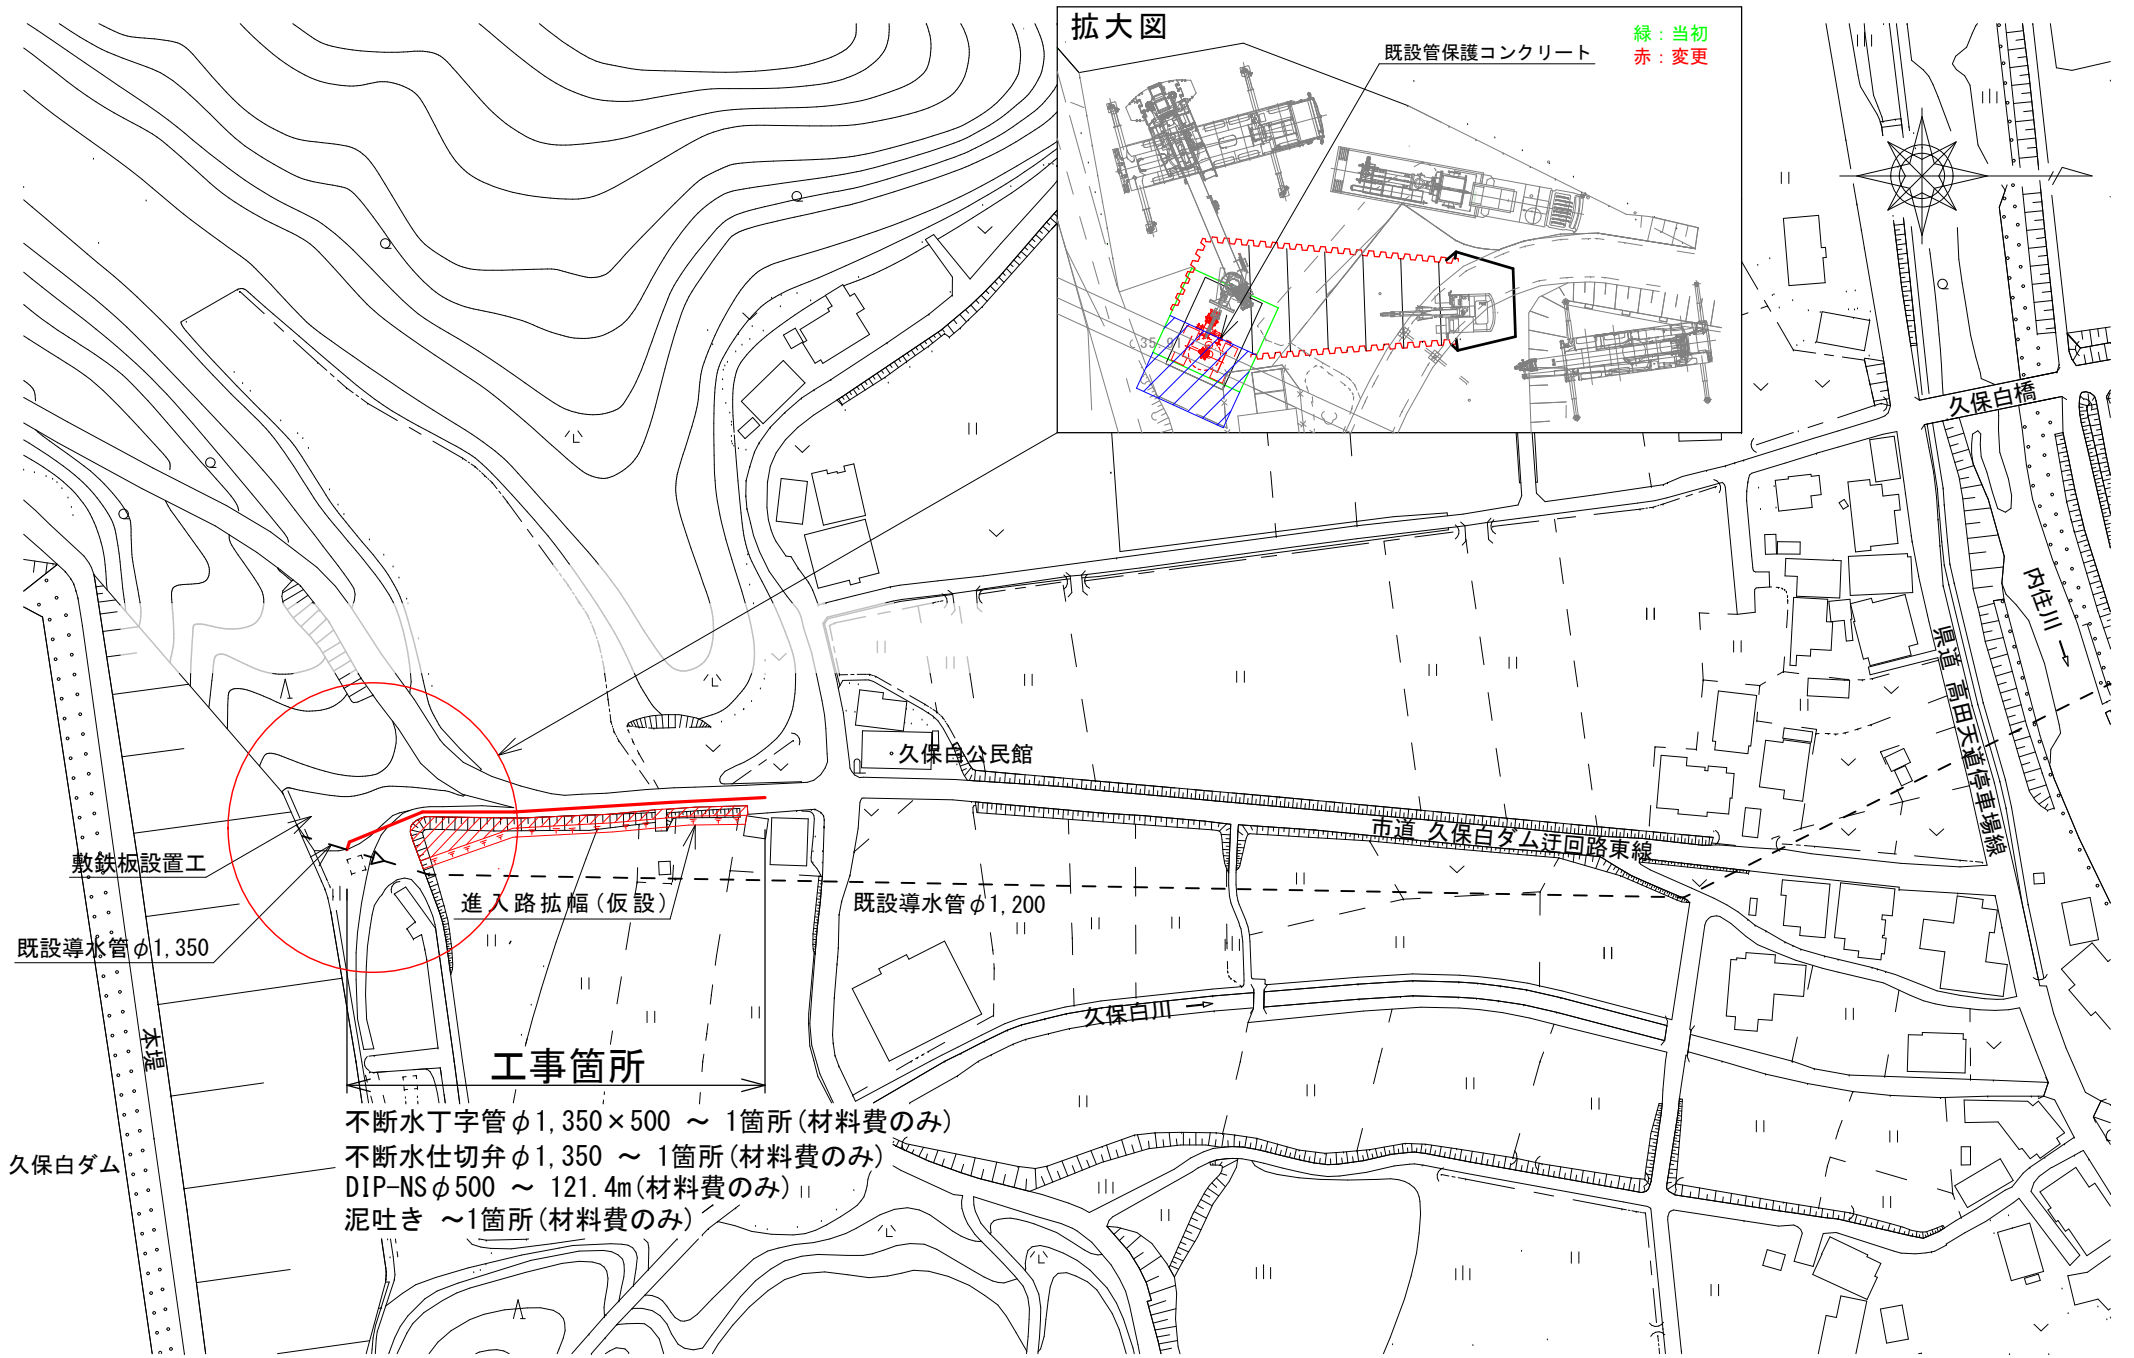

拡大図

既設管保護コンクリート

緑：当初
赤：変更

久保白公民館

久保白橋

内柱川

県道 高田天通停車場線

市道 久保白ダム迂回路東線

久保白川

敷鉄板設置工

進入路拡幅(仮設)

既設導水管φ1,200

既設導水管φ1,350

工事箇所

不断水丁字管φ1,350×500 ~ 1箇所(材料費のみ)

不断水仕切弁φ1,350 ~ 1箇所(材料費のみ)

DIP-NSφ500 ~ 121.4m(材料費のみ)

泥吐き ~ 1箇所(材料費のみ)

久保白ダム

本堤
