工事請負変更契約 報告書（企業局　上水道課）

経済建設委員会資料
令和8年11月2日提出


事業名	工　　事　　名	受注者名	変更契約金額	変更増減額	原契約金額	落札率	変更契約工期	原契約工期
水道	津原導水管布設替 (1工区)その2工事	瓜生・大貴 特定建設工事 共同企業体	－ うち消費税 －	－ うち消費税 －	128,700,000円 うち消費税 11,700,000円	－　％	令和 8年 4月1日 から 令和 9年 1月29日 まで	令和 8年 4月1日 から 令和 8年 10月30日 まで


※主な変更理由

令和8年7月５日の大雨により、約7mの深さまで掘削していた状態の不断水材料設置部分に大量の土砂が流れ込み、掘削部周辺の地盤が陥没したため、地盤の改良に時間を要すると共に、2重管となっている既設導水管の外側の保護管を撤去するための工法変更及びクレーン車の変更に伴う周辺の山林掘削・仕戻しに時間を要するため、工期の変更を行うもの。

津原導水管布設替(１工区)その２工事　位置図

経済建設委員会資料
令和 8年11月 2日提出

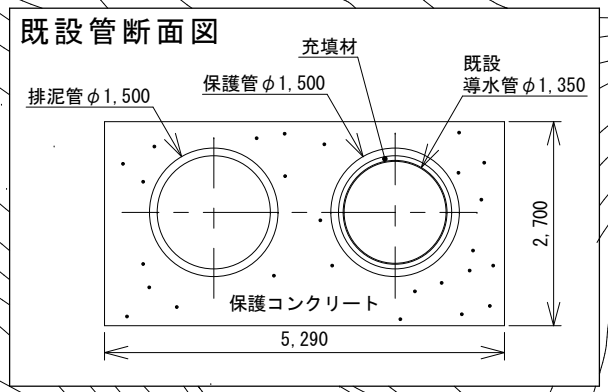

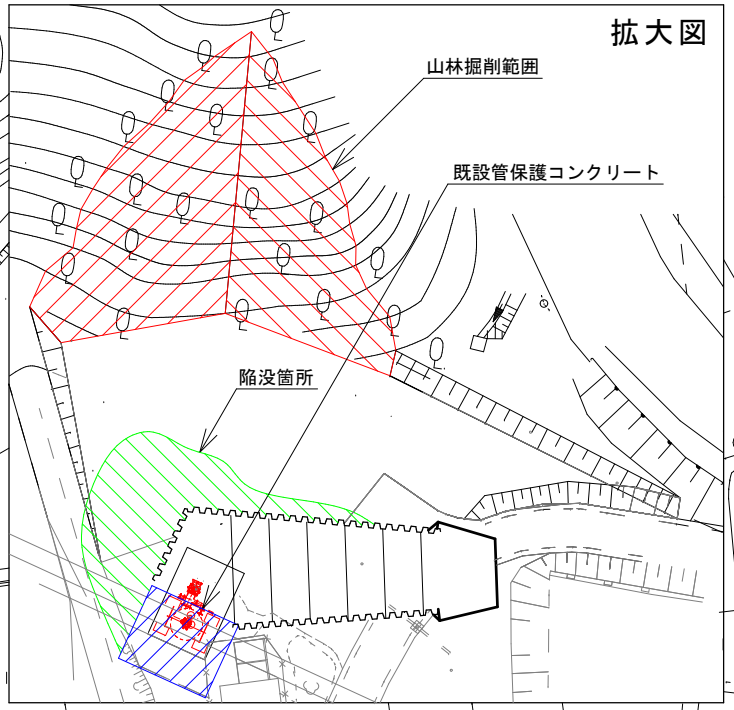

久保白橋
内住川
県道 高田天道停車場線
久保白公民館
市道 久保白ダム迂回路東線
進入路拡幅(仮設)
既設導水管φ1,200
既設導水管φ1,350
久保白川
本堤
工事箇所
久保白ダム

不断水丁字管φ1,350×500 ～ 1箇所(材料費除く)
不断水仕切弁φ1,350 ～ 1箇所(材料費除く)
DIP-NSφ500 ～ 121.4m(材料費除く)
泥吐き ～1箇所(材料費除く)
